


Detaljnivå

Faktorer som påverkar detaljnivå i tidplan:

- Komplexitet
- Storlek
- Typ av arbete och homogenitet av arbete
- Plats/läge
- Arbetsgrupp, ansvariga
- Krav
- Närtid, långt fram



Detaljnivå i tidshorisonten

Låg detaljnivå: Denna nivå är lämplig för arbeten som ligger t.ex. ett år framåt eller längre. Grova aktiviteter.

Medel detaljnivå: Arbeten som ligger mellan 3 månader och ett år framåt. Aktiviteter per teknikområde där längden inte överstiger 1 månad.

Hög detaljnivå: Arbeten inom tre månader. Detaljerad uppföljning och rapportering krävs. Beroende på projektfas kan hög detaljnivå krävas för de kommande 3–6 veckorna, som mest.



Genom att hålla aktiviteter kortare än 20 arbetsdagar kan vi flagga förseningar tidigt i aktivitetsflödet och rapportera framdriften mer konkret.

För mycket detaljer kan skapa onödig administration. Var realistisk.

Top-down principen


Nivå 1: Högsta nivån. Visar nyckel faser i projekt och på en summerad nivå.

Nivå 2: Näst högsta nivån i WBS hierarki. Denna nivå möjliggör alla involverade i projekt förstår vad som levereras och vilka gränssnitt finns mellan olika områden.

Nivå 3: Kritiska linjen och aktiviteter som utförs i olika områden framgår tydligt. Leveranser per område är synliga.

Nivå 4: Mer detaljerad än nivå 3 i områden där krävs mer detalj för de som driver arbetet.

Nivå 5: Lägsta nivån. Visar alla aktiviteter i nästan daglig detalj. Lämplig för veckoplanering för arbetsgrupper. Behöver inte vara med en del av gemensamma tidplanen.

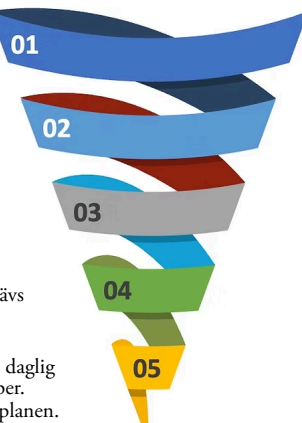


Vi kan samla information genom att;

Alt 1: Samla alla involverade under ett långt planeringsmöte

Alt 2: Boka ett antal möten med olika block/grupper/produktansvariga


Alt 3: Planera själv och presentera och diskutera med gruppen

Alt 4: Utgå från underlag som skickas från ansvariga



Identifiering av aktiviteter och milstolpar


- Kontraktuella milstolpar
- Deltider (milstolpar)
- Inläsning och utredningar
- Framtagande aktiviteter (produkt, byggnation osv...)
- Leverans milstolpar, aktiviteter (leverans av produkt)
- Gransknings aktiviteter (interna och externa)
- Besiktningsaktiviteter
- Betalplan

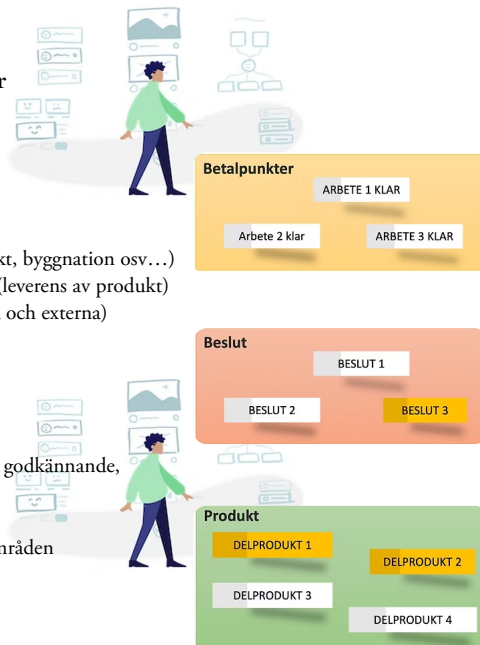


- Andra styrande tider (Tillstånd, godkännande, restriktioner osv...)
- Inköp-upphandling
- Input & output mellan olika områden
- Beslut, underlag
- Överlämning
- Summerande/level of effort
- Repetitiva

Ledtider och tidsuppskattningar

- Egen erfarenhet
- Dokumenterade processer, standarder
- Kalkyl, studera ritningar/underlag
- Resurstillgänglighet (material, arbetskraft, verktyg)
- Input från ansvariga (de som utför arbetet)
- Från tidigare projekt, arkiv
- Genom att räkna mellan bindande tider
- Budget begränsningar, arbetsmiljö, restriktioner



För aktiviteter med stora osäkerheter gör min-trolig max (optimistisk-trolig-pessimistisk) uppskattning
Obs att sätta pessimistiska värden på aktiviteter kan orsaka en onödigt lång tidplan



Vanliga fel vid tidsbedömningar:

- För optimistiska värden
- Bristande erfarenhet
- Brister i projekt
- Miss av speciella förutsättningar för projektet
- Fel minne av tidigare erfarenheter och projekt
- Fel bedömning av arbetspaket eller oklara arbetspaket definitioner
- Att inte ta med produktivitet påverkande faktorer som klimat
- Att inte ta hänsyn till resursens kompetens
- Att inte ta hänsyn till plats relaterade förutsättningar (arbetsmiljö, delad användning av verktyg, resurs)

Antaganden

- Interna ledtider
- Externa ledtider *T ex Material leveranstider, Handläggningstider hos myndigheter
- Besluts milstolpar
- Interna eller externa kopplingar

Antaganden ska dokumenteras noggrant och följs upp vid tidplan avstämningar. (Gäller för tidsrisker också)

Tidsrisker och antaganden minskar och kan ersättas av överenskommelser och mer verklighetsbaserade prognoser under projektets gång. (*För tidsrisker se Risk avsnittet)

- röda dagar (lokala eller internationella)
- semester
- restriktioner
- väder
- typ/karaktär av arbete eller produkt
- specifika resurser
- Skift
- Typ av leverantör (beställare, konsult, entreprenör)

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Typer av kalender i planeringsverktyg:

- Global Kalender (kan användas i samtliga tidplaner i verktyget/databasen)
- Projekt specifik kalender
- Aktivitet specifik kalender
- Resurskalender

[Tillbaka till Planering](#)
