

Planering med
Burak Ünal

HEM

PLANERING

MISC

OM

Basplan

Kontroll

- Rimlig detaljnivå
- Rätt kopplingar, logiska kopplingar
- Rimliga ledtider
- Saknade kopplingar, öppna ändrar
- Logiska slingor (logic loop)
- Kritiska linjen



Kom ihåg att kritiska linjen i tidplanen kan förändras (av olika anledningar) under uppdateringar av tidplanen

Krav

Beställare

Kravställande innan planeringsfas och förklara förväntningar
Definiera tidsramar för uppdraget och informera om deltid

Leverantör

Kravuppfyllande, frågeställningar

Krav på;

Uppbyggnad:

- WBS
- Detaljnivå
- Kopplingar
- Leveranser och obligatoriska moment
- Kalender
- Planeringsperiod

Uppföljning

- Frekvens
- När?
- Vad?

Rapportering

- Milstolpe rapport
- Avvikelse/orsak
- Förslag på hantering

Allmänna Bestämmelser

ABK 09

Konsulten har rätt till tidsförlängning om konsulten försenas på grund av förhållande som denne inte orsakat och vars effekt denne inte rimligen kunnat undanröja.
Part som får kännedom om förhållande som kan medföra ändring av tidplanen ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten.

AB 04

Kontraktarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning eller avlämnade på annat sätt vid kontraktstidens utgång.

Kontraktstiden skall förlängas eller avkortas i den utsträckning ÄTA-arbete eller förändringar i förhållande till angiven mängd i kontraktshandlingarna påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden.

Kvalité


Kvalitetssäkring av en tidplan

- Rimlig sluttid för projekt
- Viktiga aktiviteter finns med (leveranser, granskningar osv...)
- Begränsad användning av constraints
- Aktiviteter har logiska kopplingar (föregångare, efterföljare) och dessa stämmer överens med processer och rimliga
- Aktiviteter som inte får överlappa gör det inte
- Kritiska linje för helhet eller i faser/etapper framgår samt sekundära kritiska linjer kan analyseras
- Tidsåtgång för aktiviteter är rimliga och överenskomna med involverade parter och produktivitet samt resurstillgänglighet
- Namnsättning på aktiviteter/milstolpar är tydlig
- Simulering ger en positiv respons (t ex en fiktiv 4 månaders försening testas och spåras i tidplanens helhet)
- Användning av buffert är rimlig och buffert är inte dolt
- Rätt kalender används och relevanta aktiviteter respekterar tillståndstider, säsonger osv...

Basplan

Sista steget i planeringsfasen är att ta fram en baseline/basplan (se definitioner för förklaring) för den tidplan alla involverade parter överens om innehåll, risker antaganden osv... Det finns alltid möjlighet att uppdatera denna ursprungsplan/baseline utifrån nya ÖK mellan parter. Delar som ligger långt fram i tiden hanteras som blocktider i baseline. När det görs planering av dessa grova aktiviteter speglas dessa i baseline också.

Baseline tas fram i planeringsverktyg och en kopia sparas och görs tillgänglig för projektmedlemmar. Det är viktigt att parterna är medvetna om att baseline är bindande och följs upp under arbetsgång.

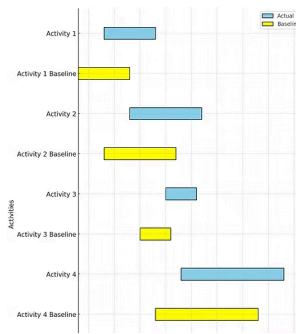


Ifall man väljer ha resurser (timmar, kostnader...) i tidplanen täcker baseline dessa.

Det är vanligtvis leverantör som tar baseline och tillhandahåller den för beställaren. Det kan tolkas som målplan projektet jobbar mot.

Det är viktigt att arbetet inte sätts igång förrän en överenskommen baseline. Baseline är nyckel för uppföljning och rapportering av avvikelser i projektet.

Ledningens roll i en hållbar tidplan:

- Design dokument är på plats i rätt tid,
- Material inköp och arbetsgrupper/underleverantörer görs i rätt tid,
- Arbetsmiljö är redo för arbetet och andra typ av tillstånd är på plats,
- Godkännandekrävande arbetsmoment godkänns i rätt tid,



- Trafikpåverkande åtgärder är rätt planerade och man har tillgång till plats,
- Arbetsgrupper jobbar enligt tidplanen och lämnar över till nästa grupp i rätt tid,
- Kommunikation och översyn av underleverantörens tidplanering,
- Ledningen ser till att synkning/koordinering av aktiviteter och grupper funkar i verkligheten. Lång framförhållning är nyckel.
- Äga tidplanen och se till att tiderna hålls, ta extra initiativ när det behövs för att hålla tider.

Tillbaka till Planering
