

Risk

Faktorer bakom Risker & Osäkerheter

- Oklarheter i arbetspaket
- Bristande kunskap i arbetet som ska genomföras
- Arbete som utförs av externa parter eller kräver externa input/förutsättningar
- Arbete långt i framtiden
- Icke kända risker
- Resurser, organisation
- Väder, platsspecifika risker (mark, omgivning)
- Grova antaganden i tidplan eller för optimistisk tidplan



Riskidentifiering och hantering görs regelbundet under projektets gång inte bara i början.


Sannolikhet och allvarighet för risker uppdateras regelbundet utifrån senaste läget. Riskerna behöver också kategoriseras utifrån riskkällor.

Behandlingsplan för risker är vital. Framförallt för risker som har störst påverkan på tidplanens kritiska linje utifrån konsekvensanalys.

I fall behandlingarna inte minimerar konsekvenser kan vi då använda risktider. Vi kan också välja ha risktid som en behandling om vi accepterar riskerna och konsekvenserna.

Tidsuppskattning av risker:


- Aktivitetsnivå
- Kritiska linje
- Nivå 1 tider (grova tider för långa, stora/komplexa projekt)



Risktidshantering i tidplaner

Risktider kan arbetas in i aktivitetens längd i fall sannolikheten att risken faller ut är stor.

Risktillägg kan också användas i tidplaner i form av bufferttid. Beroende av organisationen kan man ha en operativ tidplan som visar prognos tiderna utan risktillägg och en ledningstidplan med risktillägg. Organisationen siktar på och jobbar mot operativa tidplanen däremot ledningen kommunicerar ut risktillagda tidplanen externt.

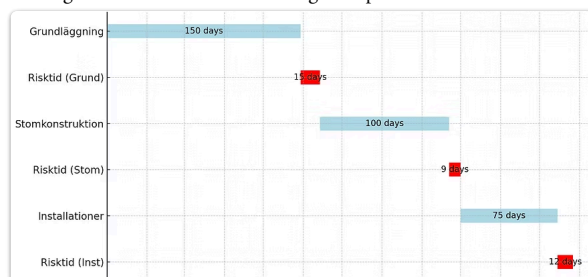

Testa olika scenarier utifrån riskbedömningar och se hur tidplanens helhet ser ut.

- Risktillägg är ett medel som ägs av part som kan hantera risken bäst.
- Bygg en flexibel tidplan för risker under genomförandet!
- För okända risker (unknown-unknown) kan vi ha en generell risktid (vissa projekt har 10% av total tid som risktid).

