


Avvikelsehantering

Orsaker till avvikelser

Avvikelser från tidplanen kan bero på flera faktorer, både interna och externa. Vanliga orsaker är:

- Låg prestation eller produktivitet
- Resursbrist (inklusive materialbrist)
- Bristande kompetens
- Brist på verktyg eller hjälpmedel
- Försenade beslut
- Sena leveranser eller input, både från interna och externa parter
- Ändrad omfattning eller omtag
- Realiserade risker
- Bristande planering i vissa delar
- Felaktiga antaganden
- Fel i kalkyler eller kostnadsberäkningar
- Övåntade förhållanden
- Kommunikationsbrister mellan involverade parter

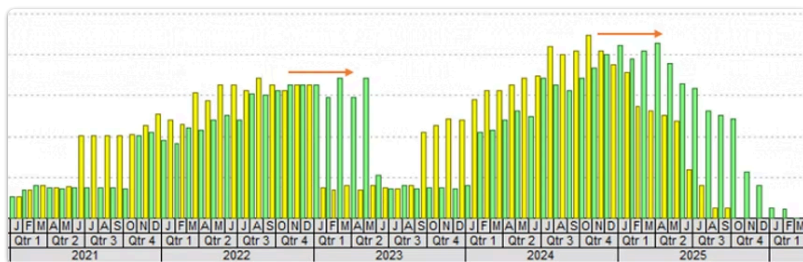

Avvikelsehantering

- Identifiera avvikelser och dokumentera orsaker till förskjutningar i hålltider, slutleveranser och projektslutdatum.
- Vid försening av projektslutdatum eller viktiga hålltider:
Identifiera de aktiviteter på kritiska linjen som bidrar till avvikelsen och utvärdera möjligheten att förkorta deras varaktighet, vilket kan kräva extra resursinsats.
- Vid försening av aktiviteter som inte påverkar kritiska linjen eller hålltider:
Analysera om avvikelsen kan accepteras, utifrån tillgängligt float och projektets marginaler.
- Utforska möjligheten att köra vissa aktiviteter parallellt istället för sekventiellt, för att reducera tidsförlust.
- Kommunicera identifierade och icke-åtgärdade avvikelser till berörda parter i god tid.
- Dokumentera eventuella nya antaganden som görs i samband med månadsavstämningen.
- Säkerställ att åtgärder genomförs, synliggör resultatet och definiera tydliga actionpunkter för fortsatt uppföljning.

Ägarskap och användning av Float

Aktiviteter som inte ligger på den kritiska linjen har ett tidsutrymme (float) där de kan försenas utan att påverka projektets slutdatum. Användningen av float är dock ofta föremål för diskussion och kan innebära utmaningar:

- **Beställarperspektiv:** Beställaren kan vilja genomföra förändringar i icke-kritiska aktiviteter (där det finns float) utan att bevilja förlängd tid till leverantören, med hänvisning till att den förändrade aktiviteten inte är kritisk.
- **Konsekvenser:** Om float utnyttjas kan leverantörens flexibilitet minska, både tidsmässigt och resursmässigt, vilket i förlängningen kan påverka projektets genomförande.
- **Lösning:** Det är viktigt att i tidigt skede komma överens om hur float ska användas och vem som "äger" den, så att det stöder projektmålen och skapar tydlighet mellan parterna.

eftersträvar större flexibilitet.

Orsak till avvikelse och konsekvenser för tidsförlängning och budget

Vem som orsakat avvikelsen avgör vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för tidsplan och budget:

- **Beställaren orsakar avvikelsen:** Leverantören har rätt till tidsförlängning och ofta även kompensation genom utökad budget.
- **Leverantören orsakar avvikelsen:** Leverantören får ingen tidsförlängning och måste hantera konsekvenserna inom befintlig tidsplan och budget.
- **Gemensam orsak (båda parter):** Leverantören har rätt till tidsförlängning, men ingen utökad budget.



Observera att leverantören ibland kan försöka använda tidsförlängning som uppstått i en del av projektet för att rättfärdiga förseningar i andra, icke-berörda delar av tidsplanen. Därför är det viktigt att beställarens organisation noggrant analyserar uppdaterad tidsplan och avvikelser för att undvika oavsiktlig utökning av tidsramar.

Tips för effektiv avvikelshantering

- **För leverantör:**
Identifiera och kategorisera potentiella avvikelser för de kommande månaderna utifrån om de "går att undvika" eller "inte går att undvika". Det är viktigt eftersom avvikelser som bedöms som möjliga att undvika sällan ger rätt till tidsförlängning.
- **För beställare:**
Var tydlig redan i projektets inledning med vilka typer av händelser som kan accepteras som giltiga avvikelser – och vilka som inte kan det. Klara riktlinjer minskar risken för framtida tvister.
- **För tidsplanerare:**
Kommunicera tydligt till projektmedlemmar som levererar input till tidsplanen att deras information är avgörande och aktivt används. Det främjar ett dubbelriktat informationsflöde och stärker engagemanget för att hålla tidsplanen uppdaterad och relevant.

Överenskomna ändringar och uppdatering av baseline

Ändringar i tidsplanen uppstår främst genom tillkommande eller förändrade arbeten (ÄTA) samt omtag, och kan påverka både tidsplanens innehåll, struktur och baseline:

- Vissa ändringar kräver endast justering av datum.
- Andra innebär strukturella omarbetningar, där aktiviteter eller kopplingar behöver förändras.
- Baseline ska alltid uppdateras utifrån den aktuella förändringens omfattning och karaktär.
- Det är viktigt att endast de delar av baseline som påverkas av ändringen uppdateras – inte hela baseline.
- Vid resurssatta tidsplaner och baselines krävs särskild noggrannhet vid justeringar, så att resursplaneringen fortsatt är korrekt.

Alla ändringar och uppdateringar ska dokumenteras noggrant under genomförandet, så att det tydligt framgår vad som ändrats och varför.

Tillbaka till Uppföljning
