

Resursutjämning

Resurskurvor möjliggör en rättare fördelning av resurser (kostnader, timmar, material) över aktiviteter i tidplaner. Dessa blir avgörande framförallt i tidplaner med långa aktiviteter.




Övergripande tidplan med resurskurvor kan användas för ekonomiska prognoser (Genom att sätta total kalkyl kostnader på aktiviteter (med kostnadskurvor))

- En långsiktig prognos för projektet
- Visar behov av medel under långa perioder
- En sammanfattningsbild över projektfaser

Varför Resursutjämnande?

Tidplaner har resurser/material sitter på olika aktiviteter
Inte alla aktiviteter sekventiella i tidplan så att det blir krockar

- Överbelastade resurser
- Resursers användning fluktuerar mycket under genomförandet (bättre ha jämnare användning av resurser)
- Begränsad resurs tillgänglighet

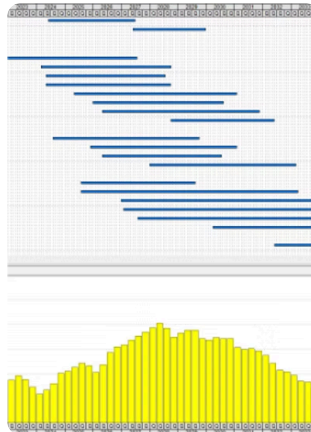

Hur åtgärda?

- Flytta icke kritiska aktiviteter (använd float)
- Sätt fler resurser
- Förläng aktivitetstid

Viktigt att tidplanen analyseras efter resursutjämnande åtgärder. Kritiska linjen kan vara påverkad av dessa.

Prioriteringsorder för resursutjämnande:

- Aktiviteter som kräver speciell kompetens/person/material
- Aktiviteter med minst total float
- I fall total float är lika, aktiviteter som kräver flest antal resurser
- I fall aktiviteter lika viktiga och kräver samma resurser, prioritera aktivitet som redan startat
- Eller Resurstillslag, split aktivitet, justera resurskurva
- I fall olika projekt i organisationen använder samma resurser då vägs in prioriteringar på den nivån.
- Det kan vara projekt budget och projekt sluttider som är avgörande i resursanvändning i vissa fall

[Tillbaka till Resurser](#)
