

Planering med Burak Ünal

HEM

PLANERING

MISC

OM


Layouter

Läsbarhetsåtgärder i Tidplaner

- Kodning av aktiviteter
- Filtrering
- Layouter

Valfri;

- Aktivitets ID eller WBS ID
- Färger på Gantt eller aktivitets tabell (möjligheten varierar mellan olika verktyg)

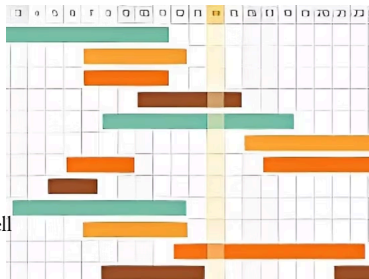

Kodning

- Leveranser
- Kontraktuella tider
- Projekt övergripande tider
- Restriktiva aktiviteter
- Aktiviteter med hög risk
- Teknikslag/område
- Aktivitetsansvarig
- Externa parter
- Etapp och Fas
- Granskningsaktiviteter
- Aktiviteter i gränssnitt av olika projekt
- Material, resurs

Kodning för övergripande/master tidplaner:

- Kontrakt
- Inköp/Upphandlingar
- Typ av uppdrag
- Entreprenadform
- Kontraktform
- Fas (högre nivå)-t ex Bygg, projektering...
- Geografiskt område

Filter

Förslag på filter i tidplaner:

- Aktiviteter med avvikelse
- Aktiviteter med framdrift över/under en vis procent
- Aktiviteter inom en period
- Leverans aktiviteter (inom en period)
- Etapp/fas/teknikområde aktiviteter
- Rapporteringsaktiviteter

Alla planeringsverktyg har filter och layout egenskaper

Layouter

Förslag på layouter för tidplaner:

- Viktiga milstolpar
- Avvikelser med float och avvikelse kolumn i aktivitets tabellen
- Projektövergripande-rolled up (nivå1-2)
- Avstämnings layouter med basplantider och kommentar kolumn

Utskrifter från tidplaner borde ha information om projektnamn, avstämningsdatum, utskriftsdatum och fastställd basplan datum

Dokumentering

- Valda processer, metoder och logiken i tidplanen
- Valda detaljnivån för olika delar av tidplan
- Färdiga layouter och andra automatiserade funktioner i planeringsverktyg
- Största risker och antaganden
- Kalender, historik om basplaner

Framgångsfaktorer för tidplaner

- Kompetenta medarbetare och projektledare
- Tillräcklig lång planeringsperiod
- Noggrann analys av underlag och krav
- God förståelse av projekt innehåll och mål
- Kommunikation

Kopplingar mellan tidplaner

1. Kopplingar till en mastertidplan (sammanfattning tidplan) från underliggande tidplaner

Direkta kopplingar mellan mastertidplan och underliggande eftersom mastertidplan har ett syfte att summera ihop informationen på en övergripande nivå.

2. Kopplingar mellan underliggande tidplaner

Primärt skuggmilstolpar (en frikopplad kopia av en äkta milstolpe) så att tidplaner inte påverkas per automatik när man uppdaterar syskon tidplaner. Skuggmilstolpe ger möjlighet att analysera situationen.

Databas Funktion

- Ett antal olika tidplaner som hör till ett stort projekt i samma yta
- Kopplingar mellan tidplaner - levande
- Automatiserad uppdatering
- Flera användare kan jobba samtidigt i samma tidplan
- Aktivitetskoder, layouter, kalendrar, resurser och andra globala medel kan användas i samtliga tidplaner
- Minskad administration

[Tillbaka till Planering](#)
